- PORTAL REWITALIZACJA
- AKTUALNOŚCI

Budowa trzech nowych dróg w centrum Łodzi na półmetku

03.08.2021 10:22 Małgorzata Loeffler / ZIM

- kategoria:
- Portal Rewitalizacji
- Rewitalizacja

Układamy krawężniki i chodniki, budujemy bezpieczne zjazdy do posesji, porządkujemy trawniki i zieleńce. Prace przy budowie nowych dróg w centrum przekroczyły półmetek. Trwają intensywne prace przy budowie trzech nowych dróg w centrum miasta. Jedna z nich połączy ulice Traugutta z Tuwima, dwie kolejne Kilińskiego z Sienkiewicza.

Trwa budowa wylotu nowej drogi uzupełniającej na ul. Sienkiewicza pomiędzy budynkiem Komendy Miejskiej Policji a numerem 32. Prace prowadzone są przy podbudowie nawierzchni i układaniu kostki granitowej na skrajach jezdni.

- Trwają roboty związane z wykonywaniem nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników na drogach A (od ul. Sienkiewicza) i B (od

ulicy Traugutta). W najbliższym czasie planowana jest kontynuacja prac nawierzchniowych oraz zakończenie prac związanych z przebudową kolizji elektroenergetycznych i prac wodno-kanalizacyjnych od ul. Tuwima. Drogi, które połączą ulice Traugutta i Tuwima oraz Kilińskiego i Sienkiewicza będą miały uspokojony ruch, wyniesione skrzyżowania i zostaną podłączone do miejskiego systemu monitoringu – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich

- Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na półmetku są prace drogowe i teletechniczne. Przed nami nasadzenia zieleni, której tu nie zabraknie. Zasadzimy ponad tysiąc krzewów i bylin oraz przeszło 30 drzew. Tak jak w przypadku innych inwestycji w rewitalizacji, będą to duże, kilkumetrowe nasadzenia. Do tego będą ławki, latarnie, stojaki i miejsca parkingowe – dodaje Wojciech Getz, IDS - BUD S.A.

Zaawansowanie inwestycji wynosi 60%, z czego podział na poszczególne branże wygląda następująco:

- roboty drogowe i zieleń – ok. 40%

- prace elektroenergetyczne (oświetlenie + kolizje) – ok. 90%

- prace teletechniczne – ok. 55%

- prace wodno-kanalizacyjne - ok. 90%

Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2021 r.

Po remoncie w Nowym Centrum Łodzi powstaną trzy nowe ulice:

* Ulica A - Będzie stanowić połączenie pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą B. Po południowej stronie wydzielone zostaną nowe miejsca parkingowe poprzedzielane zieleńcami.
* Ulica B - Połączy ze sobą ulice Traugutta i Tuwima. Po obu stronach jezdni zbudowane zostaną chodniki o zmiennej szerokości, zjazdy do posesji oraz zieleńce.
* Ulica C - Łączyć będzie ulicę B z ulicą Kilińskiego. Po jej południowej stronie zostanie wybudowany chodnik z wytyczonymi na nim miejscami parkingowymi oraz zieleńcami.

Skrzyżowania ulicy B z ulicami A i C zostaną wyniesione. W ten sposób zwiększone będzie bezpieczeństwo pieszych oraz zmniejszone ryzyko kolizji.

Nowe ulice mają dzisiaj robocze nazwy: A, B i C. Pod koniec roku, kiedy zostaną już wybudowane, radni zdecydują, jakie nadać im nazwy. Łodzianie zgłaszali już swoje propozycje, a najczęściej pojawiającymi się były: Antoniego Szrama, harcmistrza Janusza Boisse, Marii Kwaśniewskiej, rodziny Pobóg-Malinowskich i Strajku Włókniarek.

Umowa z firmą IDS - BUD S.A. na kwotę 27 675 000,00 zł (za realizację pakietu dróg uzupełniających: połączenia ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią, ul. Traugutta z ul. Tuwima, łączników do ul. Sienkiewicza oraz Kilińskiego od nowo powstałych ulic) została podpisana 26 października 2018 roku.

Projekt pn. "*Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2*" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017r. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
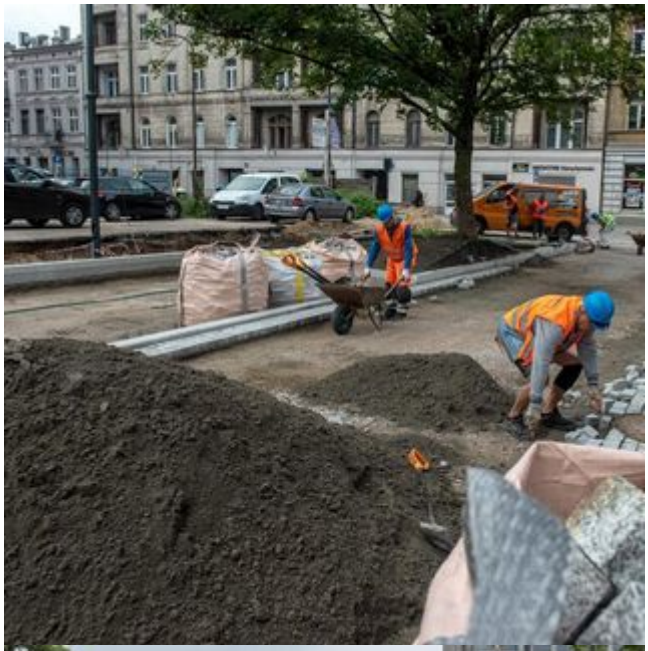
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.*
