- PORTAL REWITALIZACJA
- AKTUALNOŚCI

Remont Wojska Polskiego. Zaglądamy na plac budowy. Jak idą prace? [ZDJĘCIA]

04.08.2023 14:11 ML

- kategoria:
- Portal Rewitalizacji
- Rewitalizacja

Na przebudowywanej ul. Wojska Polskiego trwają prace remontowe. Co teraz tam się dzieje i jak zmieni się ulica?



Na zdjęciu stan prac remontowo-budowlanych prowadzonych na ul. Wojska Polskiego

Układane są płyty, maty i podkłady strunobetonowe. Na fragmencie torowiska, wzdłuż ul. Strykowskiej, trwa spawanie szyn. Z kolei w pobliżu skrzyżowania z ul. Franciszkańską prowadzone są prace przy nowych słupach trakcyjnych. Układane są chodniki, trwa budowa parkingu przy ul. Zmiennej, a pod ul. Oblęgorską budowany jest kanał technologiczny. Zakończono budowę kanału ogólnospławnego przy posesji nr 56, budowane są przyłącza kanalizacyjne na

odcinku od ul. Zielnej do ul. Obrońców Westerplatte. Układane są także kable w podstacji przy ul. Smugowej, a na wysokości starej pętli tramwajowej na ul. Strykowskiej wykonywane są prace przy nowym oświetleniu – montaż słupów i kabli.

Organizacja ruchu

Obecnie przez ul. Wojska Polskiego mamy możliwość przejazdu ul. Franciszkańską na północ (w kierunku ul. Zawiszy), a na południe od ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” przez ul. Marynarską i ul. Wojska Polskiego do ul. Źródłowej. Przypomnijmy również, że ul. Smugowa jest jednokierunkowa do ul. Franciszkańskiej.

W połowie września powinien być oddany do użytkowania wlot ul. Pankiewicza w ul. Wojska Polskiego, natomiast udrożnienie ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Młynarskiej od ul. Franciszkańskiej planowane jest do końca wakacji. W ul. Sporną skręcimy po wakacjach.

Jak się zmieni Wojska

Polskiego?

Ulica zyska nowy układ i torowisko tramwajowe (wyłączone z użytkowania w 2019 r. ze względu na katastrofalny stan techniczny). Powstaną nowe chodniki z wydzieloną drogą dla rowerów i miejscami postojowymi dla samochodów. Wzdłuż ulicy pojawi się nowe oświetlenie, a na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach – nowy systemem sygnalizacji świetlnej. Całości zmian dopełnią nowe przystanki tramwajowe i zatoki autobusowe. Powstaną na nich wysokie perony ułatwiające pasażerom wsiadanie do pojazdów.

> Planowany termin zakończenia remontu to koniec 2023 r. Inwestycja pochłonie ok. 134 mln zł, z czego ok. 65 mln zł to dofinansowanie unijne.

Projekt pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin" realizowany w ramach umowy o

dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


























CAT



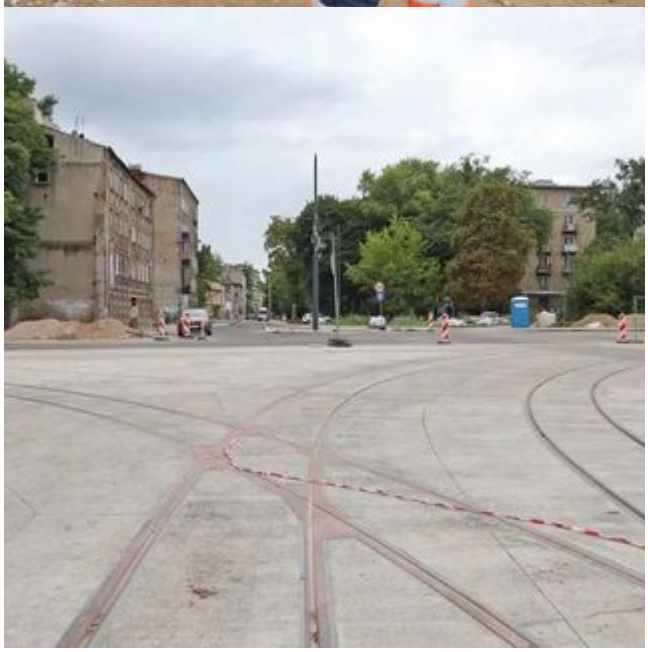






CAT






CAT
